


R08. Поэлементный перенос

Продолжение модели с учётом AP, листы 8-10

База — последняя выпущенная R07. Приложенный файл «01-2024_ИЯИ-AP-объединены(2).pdf» содержит три листа по штампу: 8, 9 и 10. Побайтовая сверка подтвердила его совпадение с прежней выборкой AP. Конструктивные детали переносятся из AC.2, без автоматического изменения их отметок по архитектурным разрезам.

Контроль	Результат
Объекты исходной R07	3048 из 3048 сохранены без изменений
Новые объекты R08	1303: 1105 в основном GLB + 198 поясняющих/каталожных
Единая сцена / навигация	4351 объект; 12 разделов; 154 готовых вида

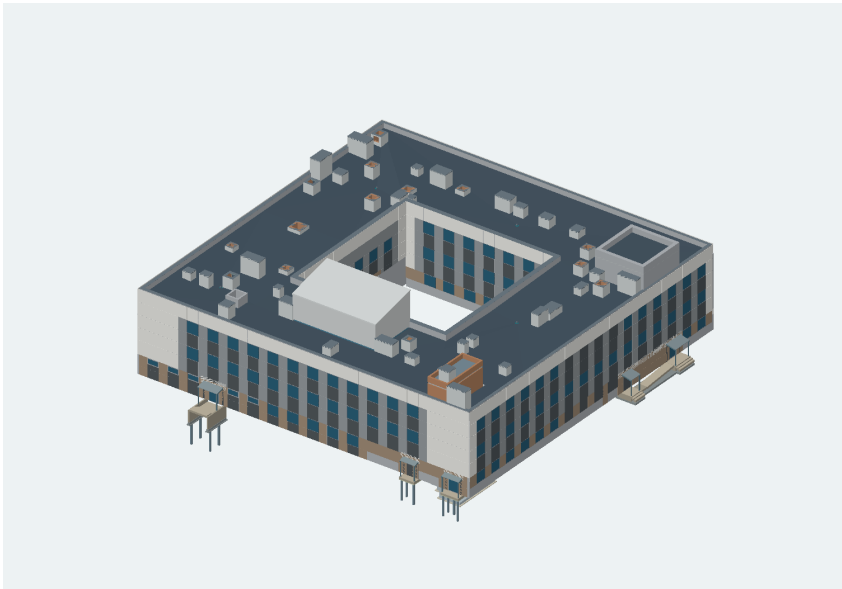

Фактический снимок общей сцены R08. Ранее проработанные кровля, лестница, перекрытия, фундаменты и входы сохранены.

Объект модели не равен строительному изделию: одна сборка содержит несколько профилей, листов и метизов. Подсчёт объектов не является подтверждением полноты спецификации.


Этот выпуск не закрывает полный перенос всего альбома. Он добавляет размещённые каркасы Ку, каталог рамок, кровельные поверхности и детализацию узла пола. Неразмещённые и недетализированные позиции перечислены отдельно.

Источники: AC.2, полный PDF на 162 страницах; AP, л.8-10. Предыдущие выборки сохранены как источники со своими названиями.

Каркасы усиления Ку

Положения сняты с торцов проёмов на поэтажных планах АС.2, л.44–46; размеры профилей и деталей — с л.89–93. Размещены 32 сборки 12 марок. Ку5, состоящий из трёх стоек, показан отдельно как каталог, без вымышленной привязки.

Этаж	Размещено	Марки
1	14	Ку1–Ку4, Ку12
2	8	Ку6–Ку10
3	10	Ку6, Ку8, Ку9, Ку11, Ку13

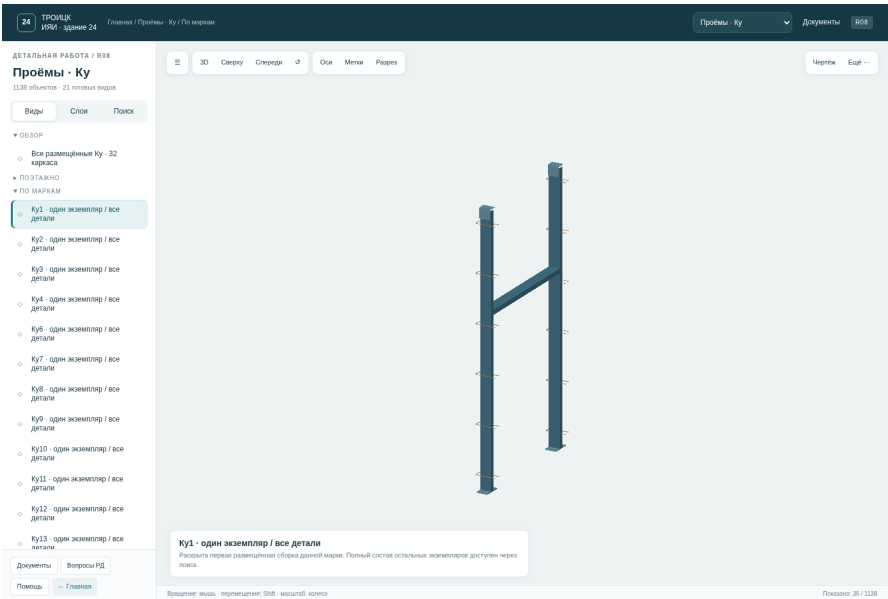

Раздел «Проемы · Ку»: один экземпляр Ку1 с раскрытыми деталями. Изображение непосредственно из просмотрщика, не иллюстрация по представлению.

Добавленные размещённые компоненты: 96 профилей, 127 листовых деталей, 504 объекта метизов и 378 гнутых связей кладки. Метизы показаны габаритно, без резьбы; радиусы прокатных профилей и полный комплект отверстий/швов не моделировались.

Остаток связей: в используемых строках спецификаций — 496, в выбранной раскладке по указанным шагам — 378; 118 не расставлены. У Ку7 длина в таблице расходится с размерной схемой. Количество не «добивалось» произвольным уменьшением шага.


Анкеровка в пустотные плиты, специальные детали Ку10 и окончательная увязка ответных частей не завершены. Основной GLB не следует использовать для сверления отверстий, заказа полного комплекта крепежа или изготовления без согласованных чертежей.

AP: кровля и нулевая отметка

В разделе кровли добавлены 26 полигонов дорожек и 22 полигона площадок. Это поверхности по векторному плану AP8: высота спроецирована на кровлю R07. Толщина, раскладка регулируемых опор и окончательная принадлежность каждой площадки к типу материала не назначались.

Проверка	AP, л.9	Перенесённая геометрия
Дорожки шириной 600 мм	198 пог. м	129,746 м² проекции; не длина осевой линии
Тротуарная плитка	107,2 м²	169,641 м² площадок: возможны другие типы покрытий
Аэраторы	18 шт.	Без подтверждённой раскладки не размещены

Контуры не подогнаны под ведомость. Дорожки и площадки исключены из основного GLB и показаны отдельно до проверки состава и расхода.

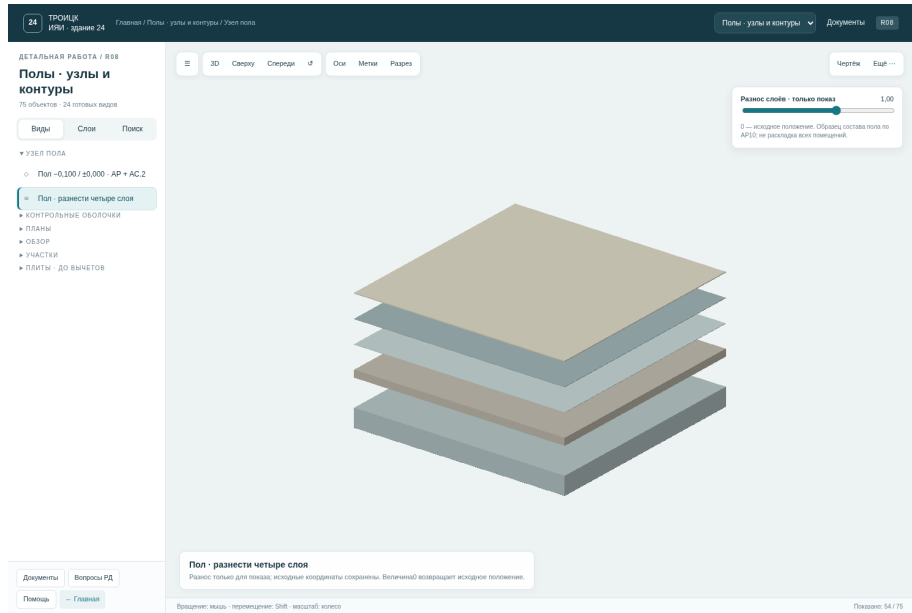


«Полы · узлы и контуры → Пол · разнести четыре слоя». При значении ползунка 0 восстанавливаются исходные координаты.

Узел -0,100 / ±0,000: по AP10 над верхом бетона показаны полусухая стяжка 80 мм, выравнивающая смесь 5 мм, клей 5 мм и керамогранит 10 мм. Сумма — 100 мм. Основание толщиной 200 мм принято из AC.2, л.11. Это локальный образец, а не назначение одного пола всем помещениям.

Девять контрольных тел Пм толщиной 200 мм созданы из прежних контуров. Вырезы под все каналы, колонны и приямки не выполнены; Пм7 и Пм8.1/8.2 требуют увязки. Тела исключены из основного GLB и из расчёта объёмов работ.

Каталог и незавершённые позиции

Рамки P-1–P-8 построены по деталям АС.2, л.147, с выделением профилей и гнутых связей. Отдельно показаны стойки и детали Ку5 по л.90. Каталогные образцы расположены вне здания и имеют явную маркировку «без привязки».

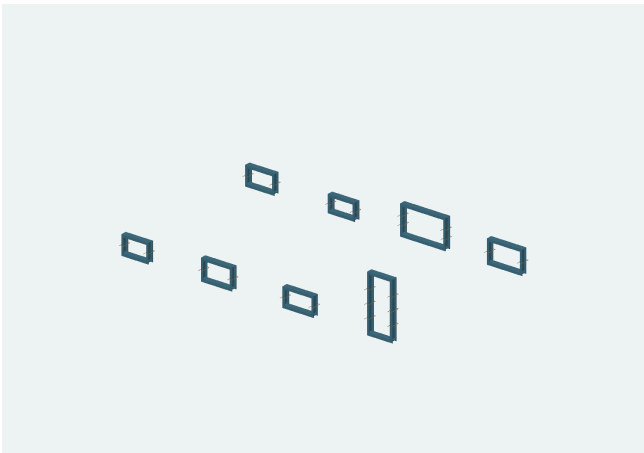

Каталог восьми типов рамок. Количество образцов не означает количество установленных рамок в здании.

Группа	Что ещё требуется для полного переноса
Ку и рамки Р	Согласовать недостающие привязки, остаток связей, анкеры в плиты, узлы и расхождения Р-3/Р-4; затем разместить экземпляры Р по фрагментам.
Рм1–Рм8	Конструкции рам оборудования не добавлены в R08; размеры по примечаниям зависят от фактического оборудования.
Плиты Пм и лотки	Полная объёмная геометрия каналов, стенок, днищ, крышек, ниш и прямков; все вычеты и армирование.
МУ, лестницы, лифты	Полные арматурные каркасы и оставшиеся обрамления, анкеровки, сопряжения и ремонтные зоны.
Венткамера, входы	Оставшиеся элементы каркаса, сварные/болтовые соединения и полная детализация козырьков.

Лист «04_Матрица_листов» индексирует 162 страницы АС.2 и 3 страницы АР. Регистрация листа не равна переносу каждой позиции. Полнота всего альбома в этой редакции не подтверждается.

Реестр R08 содержит 1303 записи геометрических объектов и отдельные неразмещённые записи. Источники, сборки, позиции и ограничения находятся в Excel/CSV и свойствах элементов. Исходные таблицы R03/R05 оставлены без перерасчёта.

Проверка и порядок работы

Проверка	Результат и область проверки
Сохранность базы	3048 исходных словарей объектов R07 сопоставлены полностью; 3048 совпадений. Уникальные идентификаторы сохранены.
Геометрия и экспорт	11 GLB повторно прочитаны. Проверены массивы координат и граней, уникальность узлов и состав экспортов. Единицы — метры; Z вверх.
Просмотрщик	12 разделов и 154 вида проверены в Chromium. Пустых видов и ошибок JavaScript в выполненных проверках нет.
Сохранение функций	Проверены кровельный пирог, оси, сетка поверхности, разнос пола и выбор прежней сборки M16×50 лестницы.
Границы испытаний	Приложение загружалось в память браузера: прямые file:// и localhost-переходы запрещены средой. Локальное открытие на устройстве пользователя и Safari не испытаны.

Как открыть

Полный ZIP: распаковать целиком и открыть **index.html**; не перемещать отдельные HTML без соседних папок. **Автономный HTML:** один отдельный файл со всеми 3D-разделами и встроенными подосновами. Полные исходные PDF и отдельные GLB находятся в ZIP.

Новые разделы: «Проёмы · Ку» — по этажам и маркам; «Рамки · P-1-P-8» — каталог. В кровле — виды дорожек/площадок; в полах — узел нулевой отметки и контрольные тела Пм. Поиск позволяет выбрать скрытую деталь и открыть её свойства.

Не смешивать экспорты

Troitsk_B24_R08.glb — физическая геометрия базовой модели и размещённых добавлений. **Troitsk_Openings_R08.glb** — те же новые Ку отдельно, не дополнительный объём. **CATALOG** и **Reference** — образцы/контрольные объекты, не монтажные координаты и не ведомость работ.

Расчёт несущей способности, сплошной поиск строительных коллизий и подтверждение фактического выполнения в этот контроль не входят. Препятствия противоречия РД сохранены. Базовые версии R06 и R07 не перезаписаны.

Контрольные файлы: qa/R08_static_checks.json; qa/R08_glb_checks.json; qa/R08_browser_checks.json; qa/R07_to_R08_preservation.csv. SHA256 исходных документов приведены на листе «06_Источники» Excel.
